Tobogán

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**DISEÑO**	**10 días**
2	DISEÑO PRELIMINAR	2 días
3	**INGENIERIA DE DETALLE**	**8 días**
4	Obras Civiles	2 días
5	Estructura Metálicas	2 días
6	Sistema de Bombeo	2 días
7	Fibra de vidrio	2 días
8	**OBRAS CIVILES**	**37 días**
9	**BASE DE ESTRUCTURA**	**16 días**
10	Preparación del terreno	4 días
11	Enfierrado	4 días
12	Encofrado	4 días
13	Vaceado	2 días
14	Nivelado	2 días
15	Secado	21 días
16	**BASE DE POSTE (2)**	**14 días**
17	Preparación del terreno	4 días
18	Enfierrado	3 días
19	Encofrado	3 días
20	Vaceado	3 días
21	Nivelado	1 día
22	Secado	21 días
23	**ESTRUCTURAS METALICAS**	**48 días**
24	Habilitación del material	7 días
25	Construcción	12 días
26	Montaje	8 días
27	Pintado	3 días
28	**SISTEMA DE BOMBEO**	**29 días**
29	Obras civiles	21 días
30	Instalación mecánica	6 días
31	Instalación electrica	2 días
32	**FIBRA DE VIDRIO**	**65 días**
33	**CONSTRUCCION**	**65 días**
34	Construcción (30 piezas)	20 días
35	Pintado y acabados	2 días
36	Montaje	20 días

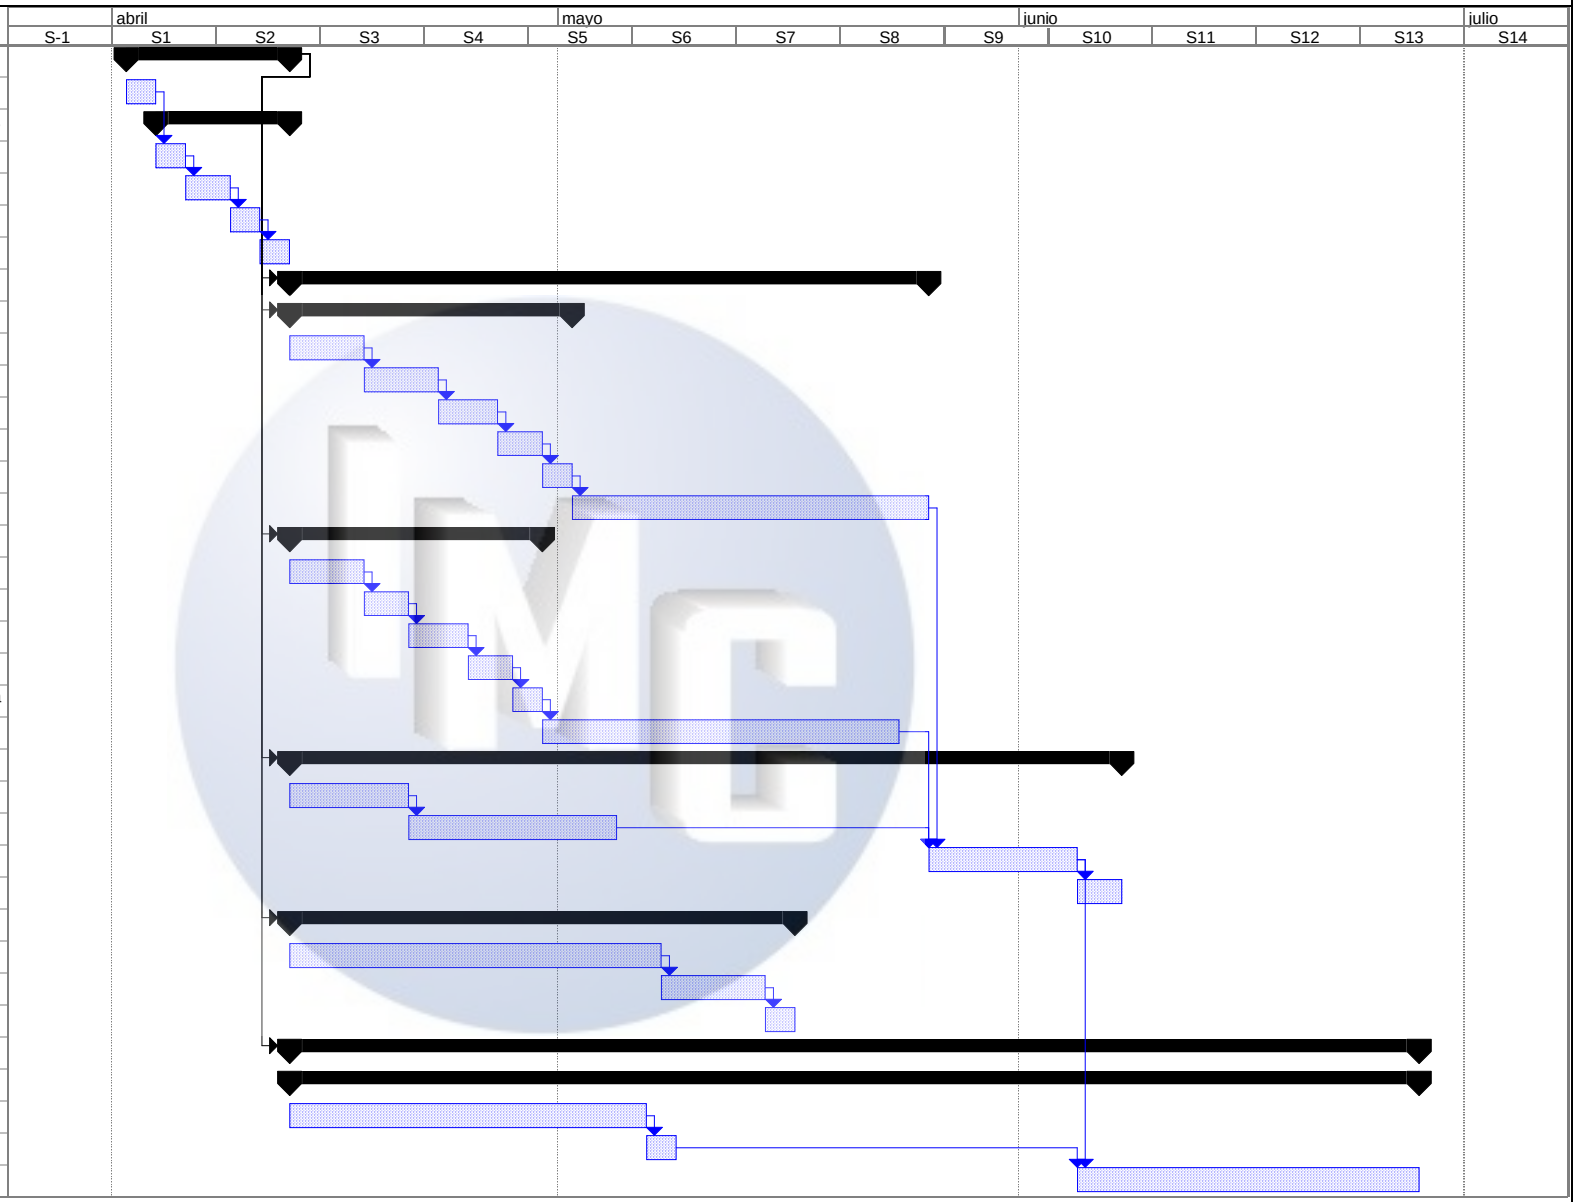

Proyecto: Tobogán
Fecha: dom 11/02/07
IMC

Tarea
División
Progreso
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
